

Informe de Gestión



Informe de Gestión Aguas de Barrancabermeja S.A. ESP presentado al Concejo Distrital

Periodo: Junio a Septiembre de 2023

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. PLAN DE DESARROLLO CENTENARIO 2020 – 2023	4
2. ACTIVIDADES GESTIONADAS PARA EL DESARROLLO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS	40
2.1. EFECTIVIDAD OPERATIVA	40
2.1.1 PROCESO GESTION DE LA OPERACION	40
2.2. CONTROL Y GESTIÓN EMPRESARIAL	50
2.2.1 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	50
2.2.2 MEJORAMIENTO DE PROCESOS	51
2.3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	54
2.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE A JUNIO DE 2023	54
2.3.2 GESTIÓN COMERCIAL	57
2.3.3 GESTION COBRO COACTIVO	58
2.4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	59
2.5. ASEGURAMIENTO GRUPOS DE VALOR	61
2.5.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL RSE	61

INTRODUCCIÓN

Aguas de Barrancabermeja SA ESP es una Empresa que presta servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico a los habitantes del casco urbano del Distrito de Barrancabermeja, a través de la gestión integral de procesos para la satisfacción de los grupos de valor, cuya visión es ser una Empresa posicionada y sostenible, con altos estándares de calidad a través de la optimización de los procesos y el compromiso constante de medición y mejora.

Comprometidos a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del área de prestación del servicio desarrolla proyectos que impactan de manera positiva el mejoramiento del servicio público de acueducto y alcantarillado.

En el presente informe de gestión se relacionan los logros obtenidos en el avance del Plan de desarrollo centenario 2020 – 2023 del Distrito de Barrancabermeja corte Junio a Septiembre de 2023 a presentarse al Concejo Distrital así como las actividades desarrolladas para el logro de los objetivos estratégicos de la Empresa los cuales son Efectividad Operativa, Gestión y Control Empresarial, Sostenibilidad Financiera, Sostenibilidad Ambiental y Aseguramiento Grupos de Valor.

1. PLAN DE DESARROLLO CENTENARIO 2020 – 2023 LINEA ESTRATEGICA

Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida

SECTOR: Vivienda, Ciudad y Territorio.

PROGRAMA 14: Servicios Públicos como Fuente de Progreso.

Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que contribuye:

6. Agua limpia y saneamiento

11. Ciudades y comunidades sostenibles

Producto 39. Mejoramiento de servicios públicos

Descripción Meta Resultado Principal: Aumentar en 4% el porcentaje de usuarios a la red de servicios públicos de calidad del Distrito de Barrancabermeja.

Indicador de resultado 39: Acceso a servicios públicos

IP 143. Número de acciones realizadas para el acceso a servicios públicos domiciliarios

Descripción Meta Producto: Realizar cinco (5) acciones para el acceso de servicios públicos domiciliarios durante el cuatrienio.

PROYECTO:

Subsidio para los usuarios estratos 1, 2 y 3 del servicio de acueducto y alcantarillado en el perímetro urbano del distrito de Barrancabermeja Santander. Convenio Interadministrativo No. 0788 de 2023 Distrito de Barrancabermeja.

Objetivo del proyecto: Subsidiar a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del servicio de acueducto y alcantarillado en el perímetro urbano

Valor del convenio: \$ 9.341.673.675

Valor ejecutado: \$8.436.549.466

Realizaciones:

Subsidiar a los usuarios estratos 1, 2 y 3 ejecutado mediante la facturación mensual del servicio de acueducto y alcantarillado en el distrito de Barrancabermeja

Impacto:

Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios beneficiados con el subsidio que aporta el Distrito de Barrancabermeja.

Población beneficiada

Grupos de Valor: Usuarios estratos 1,2 y 3

PROYECTO:

Apoyo a la gestión para la construcción de la PTAR San Silvestre (2020 - 2021 - 2022 - 2023)

Objetivo del proyecto: Apoyar la gestión para la construcción de la PTAR San Silvestre con el fin de descontaminar los cuerpos hídricos del distrito de Barrancabermeja como son el Rio Magdalena, Ciénega Miramar, Ciénega Juan Esteban, Quebrada Las Camelias, Quebrada Pozo 7, Quebrada las Lavanderas, Quebrada La Paz, Humedal San Silvestre, Humedal Palmira, Humedal San Judas, Humedal Castillo.

Valor del Proyecto: \$ 188.144.103.161 Convenio Municipio de Barrancabermeja ECOPETROL – Aguas de Barrancabermeja SA ESP

Realizaciones:

Ejecución de los contratos de obra e interventoría para la Construcción de la PTAR San Silvestre y Construcción del Emisario Final.

Contrato de Obra Pública No. 134 de 2016 Diseño definitivo, construcción, suministro de equipos electromecánicos, puesta en marcha, pre operación, operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre - Convenio de Colaboración No. DHS 157-09 de ECOPETROL y No.999-09 del Municipio de Barrancabermeja.

Contrato de Consultoría No. 043 de 2020 Interventoría, técnica administrativa, financiera y ambiental para el Contrato de Obra Pública No 134 de 2016, cuyo objeto es diseño definitivo, construcción, suministro de equipos electromecánicos, puesta en marcha, pre operación, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas

residuales san silvestre. Convenio de colaboración Nro. DHS 157-09 de Ecopetrol y No 999-09 del Municipio de Barrancabermeja.

Avance:

AVANCE PROYECTO PTAR SAN SILVESTRE

Preliminares: Emisión y aval del 100% de la Fase I de la ingeniería Básica y del 75% Fase II de la Ingeniería de detalle de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre, Actividades de Ahuyentamiento e Inventariado Forestal.

Ejecución de la fase III de construcción en las siguientes actividades:

Movimiento de tierras área general para las terrazas 81.5, 84.5 y 86.0: Desbroce, excavaciones, Carga y Transporte, Relleno y Compactación.

Diseños de Avance de la ingeniería de detalle: La totalidad de estructuras que componen la PTAR San Silvestre poseen diseños aprobados (incluye diagramas, informes, memorias, planos y estudios). De forma general, se tiene un avance en diseños correspondiente al 94,66% para todas las disciplinas involucradas en la construcción de la PTAR San Silvestre.

Obra Civil:

Actualmente se han finalizado estructuras como:

- Decantadores Primarios
- Decantadores Secundarios
- Reactor Biológico
- Cámara de Contacto
- Arqueta de Reparto
- Desarenador
- Gasómetro
- Espesadores de Gravedad
- Control de Olores
- Almacenamiento de Lodos Digeridos
- Edificio de Producción de Aire y Electricidad
- Edificio de Cloro
- Edificio de Bombeo Lodos Biológicos
- Edificio de Bombeo de Lodos Primarios
- Arqueta de Medición de Agua Cruda
- Arqueta de Medición de Agua Tratada

- Arqueta de Medición de Agua Pretratada
- Caseta de Acceso

Los edificios cuya estructura está en proceso de ejecución:

- Edificio de Administración: Se está conformando el cerramiento perimetral de dicho edificio, y se da inicio a la obra blanca del mismo.
- Edificio de Pretratamiento: Se está conformando el cerramiento perimetral de dicho edificio, y se da inicio a la obra blanca del mismo.
- Digestores: Instalación y Soldadura de Acero en el Último nivel de Muro Curvo.
- Edificio Técnico de Lodos: Conformación de la losa superior del edificio.
- EBAR: Perforación para construcción de micropilotes, Instalación de canastas y fundición en concreto de pilotes.

Para las obras anexas de urbanismo, se terminó el Cerramiento Perimetral de la planta, y se dio inicio a la conformación de andenes e instalación de bordillos. En cuanto a las vías, se tiene un avance en excavación y conformación de las vías de acceso a la planta.

Obra Mecánica: Se ha adquirido el 85% del total de equipos de proceso, y la mayoría de estos se encuentran en obra, siendo los equipos de mayor tamaño como los de Sereco los que recientemente llegaron para ser instalados en Decantadores, Espesadores y Pretratamiento. El material para la prefabricación de la tubería de acero de todo el proyecto ya fue adquirido, y adicionalmente, la tubería de los edificios de producción de aire y electricidad, reactor biológicos y bombeo de lodos primarios ya se encuentran fabricados. Constructivamente se han instalado pasamuros y tuberías que conectan tanto las estructuras con sus respectivos circuitos de tubería, como con las líneas de proceso.

Respecto a las líneas de proceso, la línea del tren de aguas se encuentra terminada, así como la línea de impulsión. Actualmente se está terminando de instalar las líneas de vaciados y retornos.

Obra Eléctrica: Tanto los equipos, como la infraestructura para los sistemas de Media Tensión (Cable, Postes, Celas de Media Tensión) y Baja Tensión (CCMs, Transformadores, Paneles de Distribución) ya fueron adquiridos en su totalidad, adicionalmente, todos los componentes de la línea de media tensión externa se encuentran fabricados, mientras que existe un avance de fabricación en CCMs, Plantas de Emergencia y Celdas de Remonte. En cuanto al sistema de Instrumentación y Automatización, se encuentran fabricados los componentes del Sistema de Control (PLCs, Switches). Constructivamente se conformaron los bancos de ductos para los sistemas de baja tensión, instrumentación e iluminación en todas las zonas de la Planta y se están instalando las bandejas y canalizaciones en los edificios de la Zona de Biológicos.

Valor Ejecutado obra: \$ 64781430982,06
Avance Obra: 38.11%
Avance Obra Plan Detallado de Trabajo: 44.32%

Valor Ejecutado Interventoría: \$ 9.852.776.039
Avance Interventoría: 94,09%

Impacto: Descontaminar los cuerpos hídricos del Distrito de Barrancabermeja mejorando la calidad de vida a todos los habitantes

Población beneficiada - Grupos de Valor: 173.187 habitantes del Distrito de Barrancabermeja que se beneficiaran una vez ejecutado el proyecto.



Render Plan de Tratamiento PTAR San Silvestre



Avance Plan de Tratamiento PTAR San Silvestre 2023

PROYECTO:

Estudio para la identificación de fuentes de abastecimiento y selección de la alternativa más viable para el suministro de agua al perímetro urbano del municipio de Barrancabermeja

Objetivo del proyecto: Identificar una fuente alternativa de abastecimiento para el suministro de agua al perímetro urbano del distrito de Barrancabermeja

Valor del proyecto: \$1.793.447.903 distrito de Barrancabermeja – recursos sistema general de REGALÍAS- SGR – ODARB

Realizaciones:

CONTRATO DE CONSULTORIA No.118 DE 2023 ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MAS VIABLE PARA EL SUMINISTRO DE AGUA AL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Valor contrato: \$1.623.462.299

Estado: Por Iniciar

CONTRATO DE CONSULTORIA No.117 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MAS VIABLE PARA EL SUMINISTRO DE AGUA AL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Valor contrato: \$ 169.985.604

Estado: Por Iniciar

Impacto: Sustentación del proyecto para la identificación de fuentes de abastecimiento y selección de alternativas viables. Mejoramiento de la calidad del agua y a su vez mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios

Población beneficiada: 216.219 habitantes del distrito de Barrancabermeja que se beneficiaran una vez ejecutado el proyecto.

IP 144. Número de plantas PTAR y PTAP mantenidas y en operación

Descripción Meta Producto: Mantener en operación las veintiséis (26) PTAR y PTAP durante el cuatrienio

PROYECTO:

Mantenimiento y operación de las MiniPtar urbanas y rurales del Distrito de Barrancabermeja (2020 - 2021 - 2022 - 2023)

Objetivo del proyecto: Mantener y operar las MiniPtar urbanas y rurales del Distrito de Barrancabermeja

Dineros aportados mediante Convenio No. 1265-2023 Distrito de Barrancabermeja – Aguas de Barrancabermeja SA ESP

INVERSIÓN TOTAL: \$ 6.742.349.545

Municipio de Barrancabermeja recursos del aporte por valor de \$6.000.332.170,00

Valor aporte dinero ejecutor Aguas de Barrancabermeja \$500.000.000

Valor aporte en especie ejecutor Aguas de Barrancabermeja \$242.017.375

FECHA DE INICIO: 11 de abril de 2023

Realizaciones:

Contrato de Obra Pública N° 068-2023: “MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS MINIPTARS URBANAS Y DE LAS MINIPTARS Y PTAP RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2023-2024, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1265-23”

Valor Obra: \$6.143.629.702,00

Fecha de inicio: 28 de abril de 2023

Fecha de terminación programada: 8 de noviembre de 2023

Valor ejecutado: \$3.518.163.421,65

Ejecución: 57,27%

Contrato de Consultoría No.069-2023: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS MINIPTAR´S URBANAS Y DE LAS MINIPTAR´S Y PTAP RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2023-2024 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1265-23”

Valor Consultoría: \$355.310.006,00

Fecha de inicio: 28 de abril de 2023

Fecha de terminación programada: 8 de noviembre de 2023

Valor ejecutado: \$ 131.952.808,47

Ejecución: 46,14%

Impacto: Saneamiento básico para los habitantes de los sectores beneficiados
MINIPTAR Urbanas: Barrio Tamarindos Club – Isla del Zapato I y II – Torres del Limonar – Bostón - Altos del Cincuentenario – Almendros – Altos de Cañaverál – Prados del Cincuentenario – Bosques de la Cira – Cincuentenario VII Etapa – Naranjos – Nuevo Horizonte – Marsella – Altos del Campestre – Colinas del Sur – La Liga – Villa Rosa – EBAR Pozo Siete – MINIPTAR Rurales: San Rafael de Chucurí – Llanito I II III – Laureles

– Colegio La Fortuna – OPERACIÓN Y MTO SIST AGUA POTABLE Corregimiento San Rafael de Chucurí

Población beneficiada – grupos de valor: Comuna 4 (100% de los habitantes), Comuna 7 (30% de los habitantes), Antonio Nariño (50% de los habitantes), Bostón (50% de los habitantes), Comuna 3 (500 habitantes), Isla del Zapato (100% habitantes), Comuna 6 (70% de los habitantes), Rural: San Rafael de Chucurí (100% de los habitantes), Llanito (100% de los habitantes), Fortuna (Estudiantes del colegio), Puerta del 11, Barrio Laureles (100% habitantes).



Adecuación de la Miniptar del Distrito De Barrancabermeja

IP 147. Número de acciones realizadas para optimizar el sistema de captación y tratamiento de agua potable en el acueducto urbano

Descripción Meta Producto: Realizar cinco (5) acciones para optimizar el sistema de captación y tratamiento de agua potable en el acueducto urbano durante el cuatrienio.

ACCIÓN:

Construcción Tanque de Contacto de Cloro

PROYECTO:

Construcción del tanque de cloro en la planta de tratamiento del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja

Objetivo del proyecto: Construir una estructura de tipo contenedor o tanque de contacto de cloro para un tanque de almacenamiento de agua y llevar a cabo el proceso de cloración

Valor del proyecto: \$4.156.055.009

Realizaciones: Proyecto formulado para gestión de recursos.

Impacto: Mejoramiento de la calidad del agua

Población beneficiada – grupos de valor: 246.848 habitantes del Distrito de Barrancabermeja

ACCIONES:

- Optimización del proceso de pre oxidación del agua en la PTAP
- Adecuación y construcción de los sistemas de sedimentación, retiro y proceso de tratamiento de lodos para la planta de tratamiento de agua potable del acueducto macro proyecto que le apuesta a conseguir recursos en el orden departamental y nacional.

Objetivo del proyecto: Optimización y construcción de los sistemas de sedimentación, retiro y proceso de tratamiento de lodos para la planta de tratamiento de agua potable del acueducto urbano del municipio de Barrancabermeja

Valor del proyecto: \$ 30.947.013.383,00

AGUAS DE BARRANCABERMEJA CMI POIR \$3.078.944.320,00

ECOPETROL \$27.868.069.063,00

Realizaciones:

Contrato de Obra Pública No. 022-2023: OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEDIMENTACIÓN, RETIRO Y PROCESO DE TRATAMIENTO DE LODOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

Valor Obra: \$ 29.400.111.128

Fecha de inicio: 06 de marzo de 2023

Contrato de Consultoría No. 023-2023: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEDIMENTACIÓN, RETIRO Y PROCESO DE TRATAMIENTO DE LODOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Valor contrato: \$ 1.535.552.290

Fecha de inicio: 03 de marzo de 2023

ACCIÓN:

Optimización del sistema de bombeo de agua cruda y de agua potable

Realizaciones:

Contrato de Servicios No. 074-2020: REPOTENCIACION DE CINCO (5) EQUIPOS DE BOMBEO Y OPTIMIZACION DEL CENTRO CONTROL DE MOTORES FASE 1 – PLANTA –FASE 2-PLANTA Y FASE 5 –BOCATOMA - REPOTENCIACION DE UN SISTEMA DE BOMBEO EN PLANTA Y DE UN SISTEMA DE BOMBEO EN BOCATOMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE BARRANCABERMEJA.

Valor contrato: \$ 595.612.403

Fecha de inicio: 15 septiembre 2020

Fecha de terminación: 3 diciembre 2020

Estado: Terminado 100%

Contrato de Obra Pública No. 126-2023: OPTIIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACIÓN EN LA PTAP FASE 4 SUB 1- REHABILITACIÓN DE DOS SISTEMAS DE BOMBEO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE BOMBAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE BARRANCABERMEJA

Valor contrato: \$ 1.224.863.142

Fecha de inicio: 2 de octubre 2023

Estado: En Ejecución

IP 149. Metros lineales construidos y/o rehabilitados de redes de acueducto

Descripción Meta Producto: Construir y/o rehabilitar dos mil (2.000) metros lineales de acueducto más en el Distrito durante el cuatrienio

Objetivo del proyecto: Construir y rehabilitar redes de acueducto en diferentes sectores del Distrito de Barrancabermeja

Realizaciones:

Construir y/o rehabilitar **2386** metros lineales de redes de acueducto urbano. Con recursos propios del POIR se desarrolla el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 075-2023: “CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO sub_2 y sub_4: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA DE 4” PVC SOBRE LA CALLE 35 ENTRE CARRERAS 34/39 Y 49/50. Y REHABILITACIÓN DE RED PRINCIPAL DE ACUEDUCTO DE AC 10” Y 8” POR PVC DE 10” Y 8”, SOBRE LA CALLE 35 ENTRE CARRERAS 34/50 BARRIOS LOS NARANJOS, LA PLANADA DEL CERRO, VILLA SANDRA, LOS PINOS; Y SOBRE LA CARRERA 34 ENTRE CALLE 35 Y PARQUE ECOLÓGICO DEL CINCUENTENARIO A EMPALMAR A RED DE 6” PVC; Y SOBRE LA CALLE 29B ENTRE CARRERAS 34/35 BARRIO EL REFUGIO COMUNA 4 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”.

Valor obra: \$2.147.698.744

Valor ejecutado: \$ 1.004.696.315

Estado: En ejecución 46,78%

Impacto: Prestación eficiente y con calidad del servicio de acueducto a 14.580 personas del sector, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes Barrios Los Naranjos, La Planada Del Cerro, Villa Sandra, Los Pinos, Cincuentenario, Refugio del Distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **2.093** metros lineales de redes de acueducto. Con recursos de regalías se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 078-2023: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Valor contrato: \$ 7.302.052.565 (recursos acueducto y alcantarillado)

Valor ejecutado: \$1.749.751.936

Estado: En ejecución 23,96%

Contrato de Consultoría No. 079-2023: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Valor contrato: \$ 436.671559 (recursos acueducto y alcantarillado)

Valor ejecutado: \$ 69.474.446

Estado: En ejecución 15,9%

Impacto: Mejoramiento del servicio de acueducto a 42.844 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Nueva Esperanza del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **1840** metros lineales de redes de acueducto. Con recursos de regalías se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 085-2023: “CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS 22 DE MARZO, VILLAMARI, ALTOS DE ISRAEL, VILLA LUISA ETAPA 2, BRISAS DE ALTAMIRA, COMUNA TRES DEL DISTRITO. FASE I BARRANCABERMEJA.”

Valor contrato: \$ 9.395.483.825 (recursos acueducto y alcantarillado)

Valor ejecutado: \$ 242.482.447,98

Estado: En ejecución 2,58%

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 101-2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS 22 DE MARZO, VILLAMARI, ALTOS DE ISRAEL, VILLA LUISA ETAPA 2, BRISAS DE ALTAMIRA, COMUNA TRES DEL DISTRITO FASE I BARRANCABERMEJA.

Valor contrato: \$570.539.793

Estado: En Ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de acueducto a 7.536 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio 22 de Marzo, Villamari, Altos de Israel, Villa Luisa etapa 2, Brisas de Altamira Comuna 3 del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **561** metros lineales de redes de acueducto. Con recursos de regalías se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 112-2023: “CONSTRUCCIÓN REDES (ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL, Y/O ACUEDUCTO Y/O OBRAS DE URBANISMO) DE LOS BARRIOS 1 DE ABRIL, SAN LUIS Y MIRADOR DEL CINCUENTENARIO DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

Valor contrato: \$ 3.081.979.245 (recursos acueducto y alcantarillado)

Estado: En ejecución

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 113-2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES (ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL, Y/O ACUEDUCTO Y/O OBRAS DE URBANISMO) DE LOS BARRIOS 1 DE ABRIL, SAN LUIS Y MIRADOR DEL CINCUENTENARIO DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Valor contrato: \$ 332.513.484

Estado: En Ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de acueducto a 632 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes de los Barrios Primero de Abril, San Luis y Mirador del Cincuentenario Comuna 1,3 Y 4 del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **1002** metros lineales de redes de acueducto. Con recursos de regalías se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 114-2023: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMOS EN EL BARRIO VILLA MARY COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

Valor contrato: \$ 2.706.972.138 (recursos acueducto y alcantarillado)

Estado: En ejecución

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 106-2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO VILLA MARY COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

Valor contrato: \$ 211.710.444

Estado: En Ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de acueducto a 752 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Villa Mary comuna 3 del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **852** metros lineales de redes de acueducto. Con recursos de regalías se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 115-2023: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO VILLA NAPOLES COMUNA 7 DEL DISTRITO BARRANCABERMEJA”

Valor contrato: \$ 3.742.117.835 (recursos acueducto y alcantarillado)

Estado: En ejecución

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 107-2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO VILLA NAPOLES COMUNA 7 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

Valor contrato: \$ 244.176.874

Estado: En Ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de acueducto a 540 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Villa Nápoles comuna 7 del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **3384** metros lineales de redes de acueducto. Con recursos de regalías se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 116-2023: “REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO INTERNACIONAL EN LA COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

Valor contrato: \$ 2.218.357.973

Estado: En ejecución

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 110-2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCCION SECUNDARIA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO INTERNACIONAL EN LA COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

Valor contrato: \$ 177.796.399,36

Estado: En Ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de acueducto a 2.224 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Internacional comuna 3 del distrito de Barrancabermeja

IP 150. Metros lineales construidos y/o rehabilitados de alcantarillado sanitario, pluvial y canalizaciones

Descripción Meta Producto: Construir y/o rehabilitar dos mil (2.000) metros lineales de alcantarillado sanitario, pluvial y canalizaciones más en el Distrito durante el cuatrienio

PROYECTO:

Construcción y rehabilitación de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial del Distrito de Barrancabermeja

Objetivo del proyecto: Mejorar y ampliar la cobertura en el servicio de Alcantarillado sanitario y pluvial en el perímetro de prestación del servicio de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

Realizaciones:

Construir y/o rehabilitar **843,99** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario. Con recursos propios de POIR se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 059-2023: CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y PLUVIALES FASE 7 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA: REPOSICIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 31 ENTRE CALLES 77 Y 77A Y EN LA CALLE 77 A CON CARRERA 31 AL FONDO DEL BARRIO SANTA ISABEL; REPOSICIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 74 ENTRE CARRERAS 23 Y 24, EN LA CARRERA 24 ENTRE CALLES 74 Y 76 DEL BARRIO BRISAS DE LA LIBERTAD; REPOSICIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO TIERRADENTRO; REPOSICIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CARRERA 35A Y REPOSICIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 35 CON CALLE 58 DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO; CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA DIAGONAL 50, VÍA LATERAL CANCHA POLIDEPORTIVA CON DIAGONAL 50 DEL BARRIO PABLO ACUÑA; Y REPOSICIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 40A AL FONDO DEL BARRIO SAN JOSE OBRERO

Fecha de inicio: 2 de mayo de 2023

Fecha de terminación programada: 27 de noviembre de 2023

Valor ejecutado: \$ 181.758.267

Estado: En ejecución 14,06%

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Santa Isabel, Brisas De La Libertad, Barrio Primero de Mayo, Pablo acuña y San José Obrero del distrito de Barrancabermeja.

Construir y/o rehabilitar **136** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial. Con recursos propios de POIR se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 060-2023: CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y PLUVIALES FASE 7 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA: REPOSICIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CARRERA 38 DEL BARRIO LOS PINOS”. BANCO BPIAS: 202302003 – ABAL036

Fecha de inicio: 17 de mayo de 2023

Fecha de terminación: 30 de junio de 2023

Valor contratado: \$ 159.555.246

Valor ejecutado: \$ 159.548.277

Estado: Terminado 100%

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 2.000 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Los Pinos del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **432** metros lineales de redes de alcantarillado pluvial. Con recursos de regalías se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 076-2023: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CL 55A ENTRE CRA 31-32 Y DIAG 49 EN INMEDIACIONES COLEGIO CASD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Fecha de inicio: 30 de mayo de 2023

Fecha de terminación: 25 de agosto de 2023

Valor contratado: \$ 586.028.049

Valor Ejecutado: \$585.129.997,00

Estado: Terminado 100%

Contrato de Consultoria No. 077-2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CL 55A ENTRE CRA 31-32 Y DIAG 49 EN INMEDIACIONES COLEGIO CASD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Valor Contratado: \$56.377.319,00

Valor Ejecutado: \$56.377.319,00

Estado: Terminado 100%

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a **596** habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes de las inmediaciones colegio CASD del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **2.434,91** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial. Con recursos de regalías se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 078-2023: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Valor contrato: \$ 7.302.052.565 (recursos acueducto y alcantarillado)

Estado: En ejecución 23.96%

Contrato de Consultoria No. 079-2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Valor Contratado: \$436.671.559,00

Estado: En Ejecución 15.91%

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 42.844 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Nueva Esperanza del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **33** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial. Con recursos propios se desarrolla el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 081-2023: “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y PLUVIALES FASE 7 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA: REPOSICIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA TRANSVERSAL 54 CON DIAGONAL 60 Y 62 DEL BARRIO EL BOSTON DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.”

Valor contrato: \$67.370.567

Valor ejecutado: \$67.370.567

Fecha de inicio: 31 de julio 2023

Fecha de terminación: 8 de septiembre 2023

Estado: Terminado 100%

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 670 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio El Boston del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **100** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial. Con recursos propios se desarrolla el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 082-2023: “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y PLUVIALES FASE 7 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA: REPOSICIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CRISTO REY. BANCO BPIAS: 202302003- ABAL036.”

Valor contrato: \$136.501.904,00

Valor ejecutado: \$136.501.904,00

Fecha de inicio: 3 de agosto 2023

Fecha de terminación: 16 de septiembre 2023

Estado: Terminado 100%

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 50 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Cristo Rey del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **3194** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial. Con recursos de regalías se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 085-2023: “CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS 22 DE MARZO, VILLAMARI, ALTOS DE ISRAEL, VILLA LUISA ETAPA 2, BRISAS DE ALTAMIRA, COMUNA TRES DEL DISTRITO. FASE I BARRANCABERMEJA.”

Valor contrato: \$ 9.395.483.825 (recursos acueducto y alcantarillado)

Valor ejecutado: \$ 242.482.447,98

Estado: En ejecución 2,58%

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 101-2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS 22 DE MARZO, VILLAMARI, ALTOS DE ISRAEL, VILLA LUISA ETAPA 2, BRISAS DE ALTAMIRA, COMUNA TRES DEL DISTRITO FASE I BARRANCABERMEJA.

Valor contrato: \$570.539.793

Estado: En Ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 7.536 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio 22 de Marzo, Villamari, Altos de Israel, Villa Luisa etapa 2, Brisas de Altamira Comuna 3 del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **422** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial. Con recursos propios se desarrolla el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 087-2023: “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y PLUVIALES FASE 7 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 37 ENTRE CALLES 75C Y 75A DEL BARRIO LA PAZ DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. BPIAS 202302003 – ABAL036. Y REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 47 ENTRE CARRERAS 16 Y 17 DEL BARRIO BUENOS AIRES. BPIAS 202302005 – ABAL041.”

Valor contrato: \$511.438.651,00

Fecha de inicio: 1 de septiembre 2023

Fecha de terminación programada: 29 de noviembre 2023

Estado: En ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 1.290 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio La Paz, Buenos Aires del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **1305** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial. Con recursos propios se desarrolla el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 088-2023: “REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO: “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL LA CALLE 47 CON CARRERA 14 AL FONDO DEL BARRIO DORADO; CONSTRUCCION Y PROLONGACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SANTA ISABEL; REPOSICION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 41 ENTRE CALLE 29B Y TRANSVERSAL 37, REPOSICION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA TRANSVERSAL 37 ENTRE CARRERA 40 Y CALLE 29B DEL BARRIO LA PENINSULA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO VILLA DE LEYVA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO 9 DE ABRIL; PROLONGACION DE DESCARGA SANITARIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS CORALES”

Valor contrato: \$2.288.639.127,00

Fecha de inicio: 18 de julio 2023

Fecha de terminación programada: 14 de noviembre 2023

Estado: En ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 2.000 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Santa Isabel, El Dorado, La Península, Villa de Leyva, Nueve de Abril, Corales del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **116** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial. Con recursos propios se desarrolla el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 091-2023: “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y PLUVIALES FASE 7 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA: REPOSICIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA DIAGONAL 60 DEL BARRIO LAS GRANJAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - BANCO BPIAS 202302003 – ABAL036”.

Valor contrato: \$205.654.167,00

Valor Ejecutado: \$205.652.952,00

Fecha de inicio: 24 de julio 2023

Fecha de terminación: 11 de septiembre 2023

Estado: Terminado 100%

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 90 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Las Granjas del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **51** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial. Con recursos propios se desarrolla el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 092-2023: “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y PLUVIALES FASE 7 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA: REPOSICION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA TRANSVERSAL 45 ENTRE DIAGONALES 58ª Y 59 DEL BARRIO KENNEDY DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA BPIAS 202302003 – ABAL036”

Valor contrato: \$141.639.034,00

Valor Ejecutado: \$141.631.984,00

Fecha de inicio: 4 de agosto 2023

Fecha de terminación: 31 de agosto 2023

Estado: Terminado 100%

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 50 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Kennedy del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **159** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial. Con recursos propios se desarrolla el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 093-2023: “REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO: CONSTRUCCION DESCOLES PLUVIALES EN EL BARRIO LAS TORRES. BANCO BPIAS 2023020005-ABAL041”

Valor contrato: \$258.902.783,00

Fecha de inicio: 19 de julio 2023

Fecha de terminación programada: 16 de octubre 2023

Estado: En ejecución 51,37%

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 408 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Las Torres del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **941** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial. Con recursos de regalías se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 095-2023: “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 15C ENTRE LAS CALLES 60 Y 61 Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERAS 15B - 15C- 15D - 16 - 16A Y LAS CALLES 62A, 62 Y LA 60A BARRIO AGUAS CLARAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

Valor contrato: \$3.158.366.414,00

Valor ejecutado: \$460.240.929,47

Fecha de inicio: 18 de julio 2023

Fecha de terminación programada: 13 de marzo 2024

Estado: En ejecución 14,57%

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 96-2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 15C ENRRE LAS CALLES 60 Y 61 Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 15B – 15C – 15D – 16 – 16A Y LAS CALLES 62A, 62 Y LA 60A BARRIO AGUAS CLARAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Valor contrato: \$244.955.016,00

Fecha de inicio: 18 de julio 2023

Fecha de terminación programada: 13 de marzo 2024

Estado: En Ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 1.526 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Aguas Claras del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **76** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial. Con recursos propios se desarrolla el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 100-2023: “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y PLUVIALES FASE 7 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA: CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 58 ENTRE CARRERAS 36D Y 36E DEL BARRIO ALCÁZAR DEL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-BANCO BPIAS: 202302003-ABAL036.”.

Valor contrato: \$108.464.172,00

Fecha de inicio: 18 de agosto 2023

Fecha de terminación programada: 1 de octubre 2023

Estado: En ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 30 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Alcázar del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **201** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial. Con recursos de regalías se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 103-2023: CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CARRERA 36 CON CALLE 73B BARRIO SANTA BARBARA DISTRITO BARRANCABERMEJA

Valor contrato: \$564.960.000,00

Valor ejecutado: \$180.896.003,00

Fecha de inicio: 31 de julio 2023

Fecha de terminación programada: 28 de octubre 2023

Estado: En ejecución 32%

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 102-2023 INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CARRERA 36 CON CALLE 73B BARRIO SANTA BARBARA COMUNA 4 DEL DISTRITO BARRANCABERMEJA

Valor contrato: \$56.377.319,00

Fecha de inicio: 31 de julio 2023

Fecha de terminación programada: 28 de octubre 2023

Estado: En ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 748 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Santa Barbara del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **60** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial. Con recursos propios se desarrolla el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 105-2023: CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y PLUVIALES FASE 7 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA REPOSICION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 52B DEL BARRIO ALTOS DEL CAMPESTRE DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA BPIAS 202302003 - ABAL036

Valor contrato: \$96.801.878,00

Fecha de inicio: 9 de agosto 2023

Fecha de terminación programada: 17 de septiembre 2023

Estado: En ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 70 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio El Campestre del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **1885** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial. Con recursos de regalías se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 108-2023: “OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SECTOR OLAYA HERRERA, PUEBLO NUEVO, URIBE URIBE EN LA COMUNA 2 DEL CASCO URBANO FASE I BARRANCABERMEJA”

Valor contrato: \$9.430.885.969,00

Valor ejecutado: \$180.896.003,00

Fecha de inicio: 23 de agosto 2023

Fecha de terminación programada: 17 de junio 2024

Estado: En ejecución 16,15%

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 109-2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SECTOR OLAYA HERRERA, PUEBLO NUEVO, URIBE URIBE EN LA COMUNA 2 DEL CASCO URBANO FASE I BARRANCABERMEJA

Valor contrato: \$567.468.566,00

Fecha de inicio: 23 de agosto 2023

Fecha de terminación programada: 17 de junio 2024

Estado: En ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 27.132 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Olaya Herrera, Pueblo Nuevo, Uribe Uribe del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **1885** metros lineales de redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial. Con recursos de regalías se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 108-2023: “OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SECTOR OLAYA HERRERA, PUEBLO NUEVO, URIBE URIBE EN LA COMUNA 2 DEL CASCO URBANO FASE I BARRANCABERMEJA”

Valor contrato: \$9.430.885.969,00

Valor ejecutado: \$180.896.003,00

Fecha de inicio: 23 de agosto 2023

Fecha de terminación programada: 17 de junio 2024

Estado: En ejecución 16,15%

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 109-2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SECTOR OLAYA HERRERA, PUEBLO NUEVO, URIBE URIBE EN LA COMUNA 2 DEL CASCO URBANO FASE I BARRANCABERMEJA

Valor contrato: \$567.468.566,00

Fecha de inicio: 23 de agosto 2023

Fecha de terminación programada: 17 de junio 2024

Estado: En ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 27.132 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Olaya Herrera, Pueblo Nuevo, Uribe Uribe del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **1150** metros lineales de redes de alcantarillado. Con recursos de regalías se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 112-2023: “CONSTRUCCIÓN REDES (ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL, Y/O ACUEDUCTO Y/O OBRAS DE URBANISMO) DE LOS BARRIOS 1 DE ABRIL, SAN LUIS Y MIRADOR DEL CINCUENTENARIO DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

Valor contrato: \$ 3.081.979.245 (recursos acueducto y alcantarillado)

Estado: En ejecución

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 113-2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES (ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL, Y/O ACUEDUCTO Y/O OBRAS DE URBANISMO) DE LOS BARRIOS 1 DE ABRIL, SAN LUIS Y MIRADOR DEL CINCUENTENARIO DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Valor contrato: \$ 332.513.484

Estado: En Ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 632 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes de los Barrios Primero de Abril, San Luis y Mirador del Cincuentenario Comuna 1,3 Y 4 del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **878** metros lineales de redes de alcantarillado. Con recursos de regalías se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 114-2023: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMOS EN EL BARRIO VILLA MARY COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

Valor contrato: \$ 2.706.972.138 (recursos acueducto y alcantarillado)

Estado: En ejecución

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 106-2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO VILLA MARY COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

Valor contrato: \$ 211.710.444

Estado: En Ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 752 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Villa Mary comuna 3 del distrito de Barrancabermeja

Construir y/o rehabilitar **1681** metros lineales de redes de alcantarillado. Con recursos de regalías se desarrollan el siguiente proyecto:

Contrato de Obra Pública No. 115-2023: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO VILLA NAPOLES COMUNA 7 DEL DISTRITO BARRANCABERMEJA”

Valor contrato: \$ 3.742.117.835 (recursos acueducto y alcantarillado)

Estado: En ejecución

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 107-2023 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO VILLA NAPOLES COMUNA 7 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

Valor contrato: \$ 244.176.874

Estado: En Ejecución

Impacto: Mejoramiento del servicio de alcantarillado a 540 habitantes del sector del Distrito, brindando calidad de vida.

Población beneficiada – grupos de valor: Habitantes del Barrio Villa Nápoles comuna 7 del distrito de Barrancabermeja

PRODUCTO 40. AGUA A UNA TARIFA JUSTA Y DE CALIDAD

IP 151. Número de estrategias realizadas para reducir el agua no contabilizada

Descripción Meta Producto: Realizar cinco (5) estrategias para reducir el agua no contabilizada durante el cuatrienio.

PROYECTO:

Construcción del anillo hidráulico (2.3 Km barrio Villarelys hasta el retén)

Objetivo del proyecto: CONSTRUCCION DE LA RED MATRIZ (ANILLO HIDRAULICO) ZONA SUR ORIENTE PARA LA SECTORIZACION Y OPTIMIZACION HIDRAULICA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. FASE 1."

Valor del proyecto: \$10.001.281.523

Avance: En construcción para presentar al MVCT a fin de viabilizar y gestionar recursos.

ACCIÓN:

Aplicación de Esquemas Diferenciales en términos del decreto 1272 del 2017, vocación urbanizable bajo el estricto cumplimiento del agua como un derecho fundamental.

Avance: Acta de reunión con la Secretaria de Planeación Distrital para definición de sectores a fin de dar inicio de aplicación del Decreto 1272 de 2017.

Certificado expedido por Planeación Distrital referente a los asentamientos susceptibles de legalización urbanística para aplicación de los esquemas diferenciales.

19 Septiembre 2022: Se realizó mesa de trabajo con el equipo de legalización de la Secretaría de Planeación Distrital, Secretaria de Gestión del Riesgo y Aguas de Barrancabermeja SA ESP, en la cual se concluyó lo siguiente:

1. La Secretaria de Planeación Distrital, enviará información a la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP de los asentamientos humanos legalizados con resolución y planos desde el año 2008 a 2022.
2. La Secretaria de Planeación Distrital relacionará información de Asentamientos Humanos con insumos para adelantar procesos de legalización urbanística.
3. La Secretaria de Planeación Distrital remitirá plano urbanístico en PDF con el sello para el ítem No. 1

Desde el mes de septiembre 2022, que se remitió el último informe de avance, no se han adelantado actividades adicionales respecto de esta meta). Esto teniendo en cuenta que aun cuando se tiene la proyección de la minuta del Convenio de Esquemas Diferenciales, esta no ha sido visada por la Oficina Jurídica del Distrito.

En la vigencia 2023, Aguas de Barrancabermeja SA ESP solicitó al Distrito, información acerca de los Barrios Legalizados y susceptibles de legalización de las vigencias 2022 y 2023, para lo cual la Secretaría de Planeación Distrital, remitió comunicación SP-0823-2023 del 24 de Julio de 2023, con la información solicitada.

Aunque a la fecha no se han aplicado los esquemas diferenciales, el Distrito de Barrancabermeja con la ruta del Plan de Ordenamiento Territorial, ha legalizado 18 sectores y tiene proyectados 15 sectores susceptibles de legalización, a los cuales se les podría implementar el esquema diferencial.

Es importante precisar que varios de los sectores legalizados tienen proyectos de inversión en ejecución, los cuales incluyen: Acueducto, Alcantarillado, Micromedición y Estabilización de Obra.

PROYECTO:

Actualización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado y optimización del Modelo Hidráulico del Casco Urbano del Municipio de Barrancabermeja

Objetivo del proyecto: CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OPTIMIZACIÓN DEL MODELO HIDRAULICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Valor del proyecto: \$ 7.282.949.379

Avance: Con certificado del banco de proyectos de Aguas de Barrancabermeja y presentado ante la Secretaria de Planeación Distrital el cual se encuentra en proceso de ajustes por observaciones.

PROYECTO:

Implementación del programa de micromedición en el Distrito del Barrancabermeja

Objetivo del proyecto: Implementar el programa de micromedición a los usuarios del servicio de acueducto en el Distrito de Barrancabermeja

Realizaciones:

Durante la vigencia 2023 se han instalado 4.369 medidores en busca de la medición del consumo que asegura una tarifa justa al usuario.

Impacto: Aumentó de cobertura de Micromedición y disminución del índice de agua no contabilizada.

Población beneficiada – grupos de valor: Usuarios del servicio de acueducto, dirigido a todos los usuarios con micromedición no efectiva del área urbana del Distrito de Barrancabermeja.

Acción. Dotación y acreditación del laboratorio de metrología de un equipo de calibración

Se cuenta con Certificado de Banco de Proyectos del Distrito para gestión de recursos del proyecto Diseño, Suministro e Instalación de equipos y adecuación obras civiles y eléctricas, para la puesta en marcha y operación del laboratorio de pruebas de medidores de agua potable en la empresa aguas de Barrancabermeja S.A ESP.

LINEA ESTRATEGICA: Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida .

SECTOR: Vivienda, Ciudad y Territorio.

PROGRAMA 14: Servicios Públicos como Fuente de Progreso.

Producto 39. Mejoramiento de servicios públicos

IP 143. Número de acciones realizadas para el acceso a servicios públicos domiciliarios

IP 144. Número de plantas PTAR y PTAP mantenidas y en operación

IP 147. Número de acciones realizadas para optimizar el sistema de captación y tratamiento de agua potable en el acueducto urbano

IP 149. Metros lineales construidos y/o rehabilitados de redes de acueducto

IP 150. Metros lineales construidos y/o rehabilitados de alcantarillado sanitario, pluvial y canalizaciones



Producto 40. Agua a una tarifa justa y de calidad

IP 151. Número de estrategias realizadas para reducir el agua no contabilizada

EJECUCIÓN DE SUBSIDIOS



Subsidio para los usuarios estratos 1, 2 y 3 del servicio de acueducto y alcantarillado del Distrito de Barrancabermeja Santander

OTORGADOS A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 PARA EL SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 142 DE 1994

VIGENCIA 2023:
\$ 9.341.673.675

VALOR EJECUTADO:
\$ 8.436.549.466

POBLACIÓN BENEFICIADA



USUARIOS BENEFICIADOS
2023: 52.087

IP 143. Número de acciones realizadas para el acceso a servicios públicos domiciliarios

PTAR SAN SILVESTRE

AVANCE OBRA PUBLICA

Ejecución: **44,32%**
Agosto de 2023

Valor Contrato Obra: \$169.998.275.832,80
Vr. Ejecutado : \$ 64.781.430.982,06

Valor Contrato Interventoría: \$10.472.407.410
Vr. Ejecutado : \$ 9.852.776.039



Solución definitiva al tratamiento de las Aguas Residuales que se producen en el distrito de Barrancabermeja

Su fin principal es la protección y descontaminación de los cuerpos hídricos del Distrito



IP 143. Número de acciones realizadas para el acceso a servicios públicos domiciliarios

FUENTE ALTERNA DE ABASTECIMIENTO

ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MAS VIABLE PARA EL SUMINISTRO DE AGUA AL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA



INVERSIÓN TOTAL:
\$1.793.447.903



IP 143. Número de acciones realizadas para el acceso a servicios públicos domiciliarios

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN PTAR & PTAP

Vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023



META 2020 - 2023

**26 UND MAN Y
OPERADAS**

**LOGRO: 26 UNIDADES
MANTENIDAS Y OPERADAS**



**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. 1265 DE 2023**

INVERSIÓN: \$6.742.349.545,00

**VALOR EJECUCIÓN
CONVENIOS 2020 - 2022:
\$15.471.289.686,69**

Recursos Distrito y Aguas de Barrancabermeja

POBLACIÓN BENEFICIADA

Sectores Beneficiados:

MINIPTAR Urbanas: Barrio Tamarindos Club – Isla del Zapato I y II – Torres del Limonar – Boston - Altos del Cincuentenario – Almendros – Altos de Cañaveral – Prados del Cincuentenario – Bosques de la Cira – Cincuentenario VII Etapa – Naranjos – Nuevo Horizonte – Marsella – Altos del Campestre – Colinas del Sur – La Liga – Villa Rosa – EBAR Pozo Siete – MINIPTAR Rurales: San Rafael de Chucurí – Llanito I II III – Laureles – Colegio La Fortuna – OPERACIÓN Y MTO SIST AGUA POTABLE Corregimiento San Rafael de Chucurí

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN PTAR & PTAP



**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. 1265-2023**

+ 70 EMPLEOS GENERADOS

Apoyamos la transferencia de conocimiento en operación de la PTAR y PTAP Corregimiento San Rafael de Chucurí por parte del personal directo de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

Realizamos mejoramiento de la infraestructura de las Miniptar del Llanito para garantizar el debido funcionamiento

Realizamos entrenamiento de personal operativo en la Planta de Tratamiento de Aguas de Barrancabermeja SA ESP



IP 144. Número de plantas PTAR y PTAP mantenidas y en operación

CONVENIO PLANTA DE LODOS

Optimización y construcción de los sistemas de sedimentación, retiro y proceso de tratamiento de lodos para la planta de tratamiento de agua potable del acueducto urbano del municipio de Barrancabermeja

Inversión:

\$ 32.455.715.165,00

Fecha de inicio obra: 06 de marzo 2023


Avance de obra: 10,3%

Aliados:



SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE MÁS DE 40 AÑOS

IP 147. Número de acciones realizadas para optimizar el sistema de captación y tratamiento de agua potable en el acueducto urbano

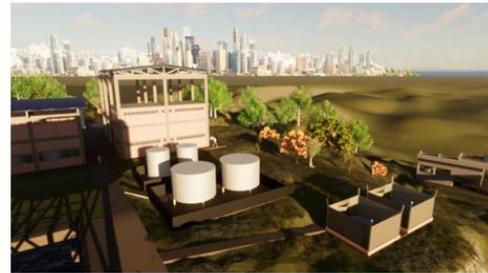

2. ACTIVIDADES GESTIONADAS PARA EL DESARROLLO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

2.1. EFECTIVIDAD OPERATIVA

Garantizar la efectividad en la prestación de los servicios de Acueducto y Saneamiento Básico

2.1.1 PROCESO GESTION DE LA OPERACION



EFFECTIVIDAD OPERATIVA

CONSUMOS INSUMOS QUIMICOS - ENERGIA

PERIODO	Consumo Químicos (Kg)	Agua tratada (m3)	Relación Consumo químicos/ Agua tratada (Kg/m3)	VARIACIÓN
JUNIO - SEPTIEMBRE 22	1.306.262	8.958.521	0,146	4,27%
JUNIO - SEPTIEMBRE 23	1.471.492	9.678.297	0,152	

OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS
(junio - septiembre 2023)

PERIODO	Consumo (kWh)	Agua tratada (m3)	Relación Consumo energía/ Agua tratada (kWh/m3)	VARIACIÓN (Incremento)
JUNIO - AGOSTO 22	3.180.041	8.958.521	0,35	2,05%
JUNIO - AGOSTO 23	3.505.927	9.678.297	0,36	

OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA
(junio - agosto 2023)

CALIDAD IRCA Muestras de Control (Enero a sept 2023)

AÑO 2023	PARAMETROS FISICOQUÍMICOS														PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS				
	MES	No. DE MUESTRAS RECOLECTADAS	COLOR (Pt-Co) STM-2120.C	TURBIDEZ NTU STM-2130.B	PH STM-4500.H+ .B	CLORO RESIDUAL mg/l STM-4500-CLG	DUREZA T. mg/l STM-2340.C	HIERRO T. mg/l STM-3500-Fe. B	CLORURO S mg/l STM-4500-Cl .B	ALCALINIDAD mg/l STM-2320.B	SULFATOS mg/l STM-4500-SO4 ²⁻	NITRATOS mg/l Método 8039; reducción de cadmio	CALCIO mg/l STM-3500-Ca. B	MAGNESIO mg/l STM-3500-Mg.B	NITRITOS mg/l STM-4500-NO2.B	ALUMINIO mg/l STM-3500-ALB	C.TOTALES UFC/ml 9222.J	E. coli UFC/ml STM1 STM-9222.J	% IRCA MENSUAL
ENERO	97	5	0,68	6,63	0,86	30,98	0,09	7,23	14,91	15,31	0,97	10,16	1,43	0,004	0,06	0	0	0,00%	0-5
FEBRERO	112	5	0,54	6,79	0,71	37,70	0,05	7,21	14,86	23,20	1,03	13,24	0,88	0,004	0,05	0	0	0,00%	0-5
MARZO	138	4	0,47	6,62	0,82	43,82	0,06	7,54	13,15	26,78	1,06	16,30	1,05	0,00	0,07	0	0	0,00%	0-5
ABRIL	158	4	0,48	6,71	0,82	61,91	0,06	10,94	13,01	32,90	1,08	17,91	2,70	0,005	0,08	0	0	0,00%	0-5
MAYO	129	4	0,45	6,95	0,90	40,94	0,06	7,95	13,64	31,57	1,02	14,05	1,88	0,006	0,07	0	0	0,00%	0-5
JUNIO	123	4	0,49	6,62	1,14	36,43	0,10	7,73	15,46	23,00	1,06	12,49	1,23	0,004	0,04	0	0	0,00%	0-5
JULIO	127	4	0,50	6,60	1,24	31,40	0,06	7,08	15,20	28,72	1,01	10,29	1,22	0,004	0,06	0	0	0,00%	0-5
AGOSTO	128	5	0,51	6,59	1,20	37,69	0,08	7,44	15,30	27,24	1,06	12,71	1,45	0,004	0,05	0	0	0,02%	0-5
SEPTIEMBRE	126	4	0,49	6,54	1,00	37,47	0,07	9,58	15,04	24,00	1,15	12,52	1,52	0,004	0,05	0	0	0,00%	0-5
PROMEDIO	1138	4	0,51	6,67	0,96	39,82	0,07	8,08	14,51	25,86	1,05	13,30	1,48	0,004	0,06	0	0	0,00%	SIN RIESGO
META Resolución 2115 de 2007	3MB 2PQ (DIARIAS)	15	2	6,5 - 9,0	0,3	300	0,3	250	200	250	10	60	36	0,1	0,3 - 2,0	0 ufc/ml	0 ufc/ ml	5%	---



El IRCA consolidado para el periodo es SIN RIESGO - Menor a 5%

PLAN DE MANTENIMIENTO BOCATOMA & PTAP

ENERO A SEPT VIGENCIA 2023



CUMPLIMIENTO 64,51%

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PLAN:

- MANTENIMIENTO SOPLADORES
- MANTENIMIENTO DE STREAMING CURRENT
- MANTENIMIENTO DE COMPRESORES
- MANTENIMIENTO MOTORES DE DISTRIBUCION
- MANTENIMIENTO VALVULAS REGULADORAS
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADORES



PLAN DE REDUCCIÓN & CONTROL DE PÉRDIDAS

VIGENCIA 2023

PROGRAMA 1: REDUCCIÓN DE LA SUBMEDICIÓN MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN

PROGRAMA 2: MACROMEDICIÓN

PROGRAMA 3: SECTORES HIDRAULICOS

PROGRAMA 4: REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y CONTROL DE PERDIDAS POR DAÑOS



CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REDUCCIÓN Y CONTROL DE PERDIDAS - CORTE SEPT 2023. 66%

PROGRAMA DE MICROMEDICIÓN - IMI



ORIGEN DEL MEDIDOR	2020	2021	2022	2023 Septiembre	TOTAL
Adquiridos por el suscriptor directamente con Aguas de Barrancabermeja SA ESP	629	3109	1767	0	5.505
Adquiridos por el suscriptor en un punto de venta autorizado	1076	3193	4939	4369	13.577
TOTAL	1705	6302	6.706	4.369	19.082

EL ÍNDICE DE MICROMEDICIÓN EFECTIVA (IMI) CORTE AGOSTO DE 2023: 86%

PERIODO	IMI	AUMENTÓ
DICIEMBRE 2021	73,68	12,33%
DICIEMBRE 2022	79,45	
AGOSTO 2023	86,01	

19.082

MICROMEDIDORES INSTALADOS

Desde Octubre 2020 – Septiembre de 2023



INVERSIÓN OBRAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



Producto 39. Mejoramiento de servicios públicos

IP 149. Metros lineales construidos y/o rehabilitados de redes de acueducto

IP 150. Metros lineales construidos y/o rehabilitados de alcantarillado sanitario, pluvial y canalizaciones

META 2020-2023

2000 ML

Logrado
54.790 ML

META 2020-2023

2000 ML

Logrado
15.127 ML



INVERSIÓN EN REDES ACUEDUCTO & PTAP

VIGENCIAS 2020 – 2021 – 2022 - 2023



19.180.350.559
RECURSOS PROPIOS

42.821.568.500
REGALIAS

216.219
HABITANTES DEL DISTRITO



60.9 KM

KILÓMETROS DE REDES DE ACUEDUCTO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS

Meta cuatrienio: 2 KM

KILOMETROS DE REDES DE ACUEDUCTO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS

INVERSIÓN EN REDES ALCANTARILLADO

VIGENCIAS 2020 – 2021 – 2022 - 2023



28.025.698.622
RECURSOS PROPIOS

42.477.290.517
RECURSOS DE REGALIAS

216.219
HABITANTES DEL DISTRITO



30.3 KM

KILOMETROS DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS

Meta cuatrienio: 2.000 M

METROS LINEALES DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS

ASI VAN NUESTRAS OBRAS

#AguasContigo

👉 ¡Las obras de Aguas Claras avanzan positivamente! NO PARAMOS de construir el desarrollo.

👉 Así lo dimos a conocer a la comunidad en la reunión informativa.

A la fecha:

✅ Hemos instalado el 100% de la tubería principal sanitaria y pluvial.

✅ Se han instalado el 80% de la acometidas domiciliarias

✅ Iniciamos labores de instalación de bordillo y cajeo de la vía.

✅ Se han construido 17 pozos, de los 21 que integran el sistema.

⚠️ En Aguas seguimos trabajando para entregarles bienestar y calidad de vida.

#AvanceDeObra



#AvanceDeObras

👉 ¡Con Aguas la obra del 22 de marzo sí se hace!

Ahora nos trasladamos al barrio 22 de marzo, donde realizamos el Comité Técnico de Seguimiento de la obra, cuyo avance total está en un 10%.

👉 A la fecha se han instalado 1100 ml de tubería de acueducto y 500 metros lineales de tubería pluvial, así como la construcción de pozos en las zonas internas.

👉 Para la próxima semana iniciamos las pruebas hidrostáticas en dos tramos donde hemos instalado las redes de acueducto.

👉 Seguimos transformando con los recursos de Regalías y el respaldo del Alcalde, nuestro Distrito.



Realizamos visitas y recorrido a las obras constantemente para asegurar el avance programado



Así vamos en el barrio 1 de Abril, aquí estamos instalando acueducto, alcantarillado y haremos la estabilización de la obra

#AguasContigo

👉 Iniciamos obras de alcantarillado sanitario y pluvial en el barrio San Luis.

👉 Hoy nos trasladamos a este barrio de la Comuna Uno, para dialogar con la comunidad sobre el inicio de este importante proyecto que va a generar calidad de vida a más de **250** habitantes.



#AguasContigo

👉 Estamos escribiendo una nueva historia en el barrio Internacional.

👉 Con la rehabilitación de 3.4 kilómetros de redes de acueducto, vamos a garantizar: calidad, continuidad y presión a más de **2300** habitantes.

#ObrasQueCambianVidas

#RegalíasBienInvertidas



#AguasContigo

👉 A toda marcha en Santa Bárbara.

👉 Con un porcentaje del 33% avanzamos con la construcción de los tramos de alcantarillado sanitario y pluvial que estamos realizando en la carrera 36 con calle 37B, para minimizar las inundaciones y beneficiar a **250** habitantes del sector.

#EstabilizaciónDeLaVía

#RegalíasBienInvertidas



INVERSIONES POR COMUNAS

- 1 — Buenos Aires – San Luis
- 2 — Aguas Claras – Inmediaciones Colegio CASD - Olaya Herrera
- 3 — Santa Isabel – Brisas de la Libertad - 1 de Abril – Villa Mary – Internacional – 22 de Marzo - Altos de Israel – Villa Luisa II Etapa – Brisas de Altamira
- 4 — La Península – Los Pinos – Miradores del Cincuentenario – Santa Bárbara – Planada del Cerro – Los Naranjos – Villa Sandra
- 5 — Las Torres– La Paz – Alcázar – San Jose Obrero – 1 de Mayo – Nueva Esperanza – Tierradentro
- 6 — Boston – Kennedy - Granjas
- 7 — 9 de Abril – Pablo Acuña – Altos del Campestre – Villa Nápoles

Gobierno
de Obras



GESTIÓN DE PROYECTOS

JUNIO A SEPTIEMBRE 2023



PROYECTOS VIABILIZADOS EN EL PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2023

Sector acueducto CMI	4
Sector Alcantarillado CMI	2
Sector Acueducto y Alcantarillado Otras Fuentes	4
Total	10

GESTIÓN DE PROYECTOS

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIACION	ESTADO
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO VILLA MARY COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	\$ 2.920.075.831	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA – RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS- SGR - ODARB	CON ACTA DE INICIO
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO VILLA NAPOLES COMUNA 7 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	\$ 3.989.672.696	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA – RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS- SGR - ODARB	CON ACTA DE INICIO



GESTIÓN DE PROYECTOS

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN



NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIACION	ESTADO
REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO INTERNACIONAL EN LA COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	\$ 2.396.264.667	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA – RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS- SGR - ODARB	CON ACTA DE INICIO
OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SECTOR OLAYA HERRERA, PUEBLO NUEVO, URIBE URIBE EN LA COMUNA 2 DEL CASCO URBANO FASE I BARRANCABERMEJA	\$10.000.000.000	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA – RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS- SGR - ODARB	EN EJECUCION

DAMOS CUMPLIMIENTO A LA NORMA, RESOLUCIÓN 330 DE 2017

RESOLUCIÓN 799 DE 2021 Art. 138 Num. 13, por la cual se modifica el reglamento técnico de agua y saneamiento (RAS)



OBRAS QUE CAMBIAN VIDAS.. BARRIO PABLO ACUÑA



DISMINUCIÓN DE DAÑOS EN REDES ACUEDUCTO



***92%**

Disminuyeron los daños como consecuencia de las Inversiones en la Infraestructura de acueducto



ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS

- Protección por fluctuaciones de presión en estas redes, con la instalación de las válvulas de ventosas
- Mayor control de sectores de distribución con la instalación de válvulas de cierre para operar en microcircuitos hidráulicos en sectores específicos donde viene avanzado en las inversiones para reposición de las redes.
- Implementación estricta de maniobras de control de presión en las válvulas reguladoras a la entrada de cada una de las líneas de distribución principal.
- Seguimiento en campo del comportamiento hidráulico en los distintos sectores abastecidos.
- Mantenimiento permanente de los circuitos de distribución con la manipulación de elementos hidráulicos de control (purgas).

2.2. CONTROL Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Asegurar la gestión integral de los procesos a través de la mejora continua.

2.2.1 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, es un marco de referencia diseñado para que las entidades identifiquen problemáticas, planeen, ejecuten y hagan seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano.

El Modelo cuenta con una herramienta en línea, el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión, FURAG, a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte.

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. registra para la evaluación de la gestión vigencia 2021 un **IDI** de **70.9** puntos ubicándose por encima del puntaje promedio de las entidades del grupo par que está en 63.2 puntos.

El promedio grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo. Para el caso de nuestra empresa, el grupo par está conformado por 133 empresas del sector servicios públicos con características similares.



2.2.2 MEJORAMIENTO DE PROCESOS

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO - IGPR

Proyectos Financiados con recursos del Sistema General de regalías y seguimiento a través de la plataforma GESPROY-SGR, con cargue oportuno



GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CAMPAÑAS CORPORATIVAS

Recolectar información para actualizar base de datos:

- Cédula – teléfono y otros de cada usuario.
- Cobros persuasivos
- Abonos - acuerdos de pago
- Cortes – suspensiones
- Actualización de datos
- Revisión técnica
- Asesoría integral al usuario
- Cortes especiales



DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO



En reconocimiento a los servidores públicos de la entidad, realizamos el día del servidor público, logrando concientizar a todos los colaboradores de la importancia del rol como servidor público y del valor que genera estar en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que nos relacionamos a diario en el desarrollo de las labores cotidianas, buscando siempre mejorar el bienestar de la comunidad.



GESTIÓN DOCUMENTAL

ESTRATEGIA TERRITORIAL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

La Gestión Documental se ha convertido en un propósito de esta Administración, siendo una parte esencial de cualquier operación empresarial eficiente.

1. Realización de monitoreo constante de los planes aprobados para las vigencias 2022-2028, PGD Plan de Gestión Documental, PINAR. Plan de Inventario Archivístico, MANUAL DE TAXONOMÍA, Una gestión documental adecuada facilita la recuperación y el intercambio de información, lo que mejora la eficiencia operativa y reduce el estrés en el lugar de trabajo.

2. Seguimiento al Sistema Integrado de Conservación documental proyectado a 2028



CAMPAÑA SERVICIO AL CIUDADANO

"Servicio Ciudadano: Compromiso Público"

El objetivo es promover la formación y responsabilidad en la función pública para mejorar nuestro servicio a la comunidad. ¡Juntos podemos hacer la diferencia!

👤 ¡El servicio ciudadano es nuestro compromiso público! ¡Vamos por un servicio público de excelencia!



ESTRATEGIAS DE RECAUDO – PUNTOS DE PAGO



2.3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Garantizar la sostenibilidad financiera para genera valor económico para la empresa

2.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE A JUNIO DE 2023

Es el documento contable que refleja la situación financiera de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A ESP., con corte al 30 de junio de 2023 y que permite efectuar un análisis de los resultados, comparados con el mismo período del año anterior, incluye el activo, el pasivo y el capital contable o patrimonio.

ACTIVOS:

	ACTIVOS	JUNIO 2023	JUNIO 2022	VARIACIÓN
	EFFECTIVO	6.954.319.037,57	3.003.141.428,37	131,57%
	DEUDORES	18.052.266.054,08	31.007.284.662,15	-41,78%
	Servicios Públicos	20.069.631.954,79	19.124.855.297,42	4,94%
	Otros deudores	12.538.159.140,29	24.860.788.279,83	-49,57%
	Deterioro de Deudores	-14.555.525.041,00	-12.978.358.915,10	12,15%
	INVENTARIOS	178.291.661,65	192.402.802,05	-7,33%
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	26.598.907.213,93	21.706.844.366,80	22,54%
	OTROS ACTIVOS	4.208.588.030,55	3.730.414.851,14	12,82%
	Impuesto de renta diferido	4.168.985.090,55	3.699.602.027,14	12,69%
	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10.658.035,00	0,00	#jDIV/0!
	Intangibles	28.944.905,00	30.812.824,00	-6,06%
	TOTAL ACTIVOS	55.992.371.997,78	59.640.088.110,51	-6,12%

Los activos son todos aquellos bienes, recursos, derechos y valores con los que cuenta una empresa, es decir, todo aquello que suma a su favor. Pueden ser bienes inmuebles, construcciones, infraestructuras, máquinas, vehículos, equipos tecnológicos o sistemas informáticos, pero también derechos de cobro por servicios prestados a terceros o la venta física de productos y bienes a sus clientes.

Los activos de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., a 30 de junio de 2023 asciende a la suma de \$55'992.371.997,78 los cuales están representados así: Efectivo, Deudores, Inventarios, Propiedad Planta y Equipos y Otros Activos; en comparación con el mismo periodo del año anterior tuvo una disminución del 6.12%.

Dentro de las partidas más significativas en los activos encontramos:

Efectivo: La empresa dentro de su cuenta de recursos en efectivo en bancos la suma de \$6.954.319.037,57, de los cuales el 24% corresponde a recursos propios (\$1.672.316.417,56) y, el 76% (\$5.282.002.620,01) a de recursos recibidos en administración o recursos de convenios.

Deudores: con respecto al año anterior, este rubro tuvo una disminución del 41,78% que obedece principalmente a la ejecución de obras, y a la disminución de cuentas por cobrar -otros deudores correspondiente a recursos sin situación de fondos .

Propiedades, Planta y Equipos: se presenta un incremento del 22,54% en el año 2023 respecto al año 2022; dentro de lo más representativo se destaca la activación en redes de acueducto y alcantarillado.

PASIVOS:

Los Pasivos de la empresa a junio 30 de 2023 suman \$28'850.504.334,90 los cuales están conformados por:

	PASIVO	JUNIO 2023	JUNIO 2022	
	CUENTAS POR PAGAR	24.779.675.046,23	34.591.437.499,14	-28,36%
	Operaciones de Crédito	833.333.335,67	0,00	
	Adquisición de Bienes y Servicios	2.176.910.463,67	3.581.555.990,93	-39,22%
P	Acreedores	4.372.053.780,94	3.990.799.831,12	9,55%
A	Retención en la Fuente	228.110.966,92	305.665.985,09	-25,37%
S	Impuestos Contribuciones y Tasas	375.013.551,00	467.453.467,00	-19,78%
I	Impuesto al valor agregado	619.783,00	12.868.574,00	-95,18%
V	Depósitos Recibidos de Terceros	16.793.633.165,03	26.233.093.651,00	-35,98%
O				
S				
	OBLIGACIONES LABORALES	1.835.335.405,97	1.757.236.866,28	4,44%
	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.227.267.837,00	3.966.426.394,00	-43,85%
	OTROS PASIVOS	8.226.045,70	21.931.463,84	-62,49%
	TOTAL PASIVOS	28.850.504.334,90	40.337.032.223,26	-28,48%

Cuentas por pagar: suman \$24.779.675.046,23 dentro de los cuales se encuentra cuentas por pagar por préstamos banca comercial, por bienes y servicios, retenciones e impuestos y otros acreedores, depósitos recibidos en administración; Con respecto al mismo período del año anterior, tuvo una disminución del 28,36%, principalmente con la ejecución de convenios con cargo al SGR.

Pasivos estimados y provisiones: Si bien la empresa tiene demandas en contra por valor de alrededor de los 26 mil millones de pesos, con corte al mes de junio de 2023 se han contabilizado provisiones para su cubrimiento por valor de \$2.227.267.837, presentando una disminución del 43.85% con respecto del mismo periodo del año anterior.

Otros pasivos: comprenden los valores correspondientes a ingresos recibidos por anticipado por un valor de \$8.226.045,70.

PATRIMONIO:

PATRIMONIO		JUNIO 2023	JUNIO 2022	
PATRIMONIO	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.169.292.044,80	20.127.941.025,42	5,17%
	Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	2.830.000.000,00	0,00%
	Capital Fiscal	1.305.707.907,00	1.305.707.907,00	0,00%
	Reservas	5.879.908.778,97	5.879.908.778,97	0,00%
	Utilidad o Excedente Acumulados	11.153.675.358,83	10.112.324.339,45	10,30%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.972.575.618,08	-824.885.138,17	-824,05%
	TOTAL PATRIMONIO	27.141.867.662,88	19.303.055.887,25	40,61%

El patrimonio líquido es el resultado de depurar los activos restándole los pasivos, es en realidad lo que la empresa posee, ya que los pasivos son obligaciones con terceros, y parte de los activos están respaldando esas deudas, interpretándose que en un momento dado los activos pertenecen a esos terceros, puesto que están respaldando una obligación, la cual se puede hacer exigible para su cancelación.

Con corte al mes de junio de 2023 el patrimonio se encuentra por valor de \$27'141.867.662,88; el cual tuvo un incremento del 40.61% respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior en razón al resultado del ejercicio.


ESTADO DE RESULTADOS

	JUNIO 2023	JUNIO 2022
INGRESOS OPERACIONALES		
Servicio de Acueducto y alcantarillado	22.941.040.375,00	20.356.194.801,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-387.281.167,00	-501.311.144,00
Total ingresos operacionales	22.553.759.208,00	19.854.883.657,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS		
Servicio de Acueducto	9.651.322.211,04	11.147.468.442,65
Servicio de Alcantarillado	4.150.744.352,41	5.584.181.851,42
Total costo de ventas	13.802.066.563,45	16.731.650.294,07
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	8.751.692.644,55	3.123.233.362,93
GASTOS OPERACIONALES		
De Administración	4.329.536.686,49	3.962.424.026,12
Provisiones, amortización, deterioro	379.854.344,00	80.595.358,00
Total gastos operacionales	4.709.391.030,49	4.043.019.384,12
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	4.042.301.614,06	-919.786.021,19
OTROS INGRESOS		
Financieros	75.186.577,18	74.213.366,64
Otros ingresos diversos y extraordinarios	2.165.837.876,16	66.644.975,54
Total otros ingresos	2.241.024.453,34	140.858.342,18
Financieros	250.264.611,41	42.698.188,16
Gastos diversos	60.485.837,91	3.259.271,00
Impuestos Diferidos	0,00	0,00
Total gastos	310.750.449,32	45.957.459,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.972.575.618,08	-824.885.138,17

Con corte al 30 de junio de 2023, los Estados Financieros de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. ESP., arrojan una utilidad de \$5'972.575.618,08, y es el resultado aritmético de tomar los ingresos del período y restarle los costos y gastos asociados al mismo periodo.

En términos sencillos este reporte es muy útil para la gerencia, ya que ayuda a saber si la empresa está prestando los servicios misionales, qué cantidad está vendiendo como servicios, cómo se están administrando los gastos y cuál es el costo de ventas de tal modo que nos da a saber con certeza si estamos generando utilidades o no, brindado una visión panorámica del comportamiento de la empresa

2.3.2 GESTIÓN COMERCIAL

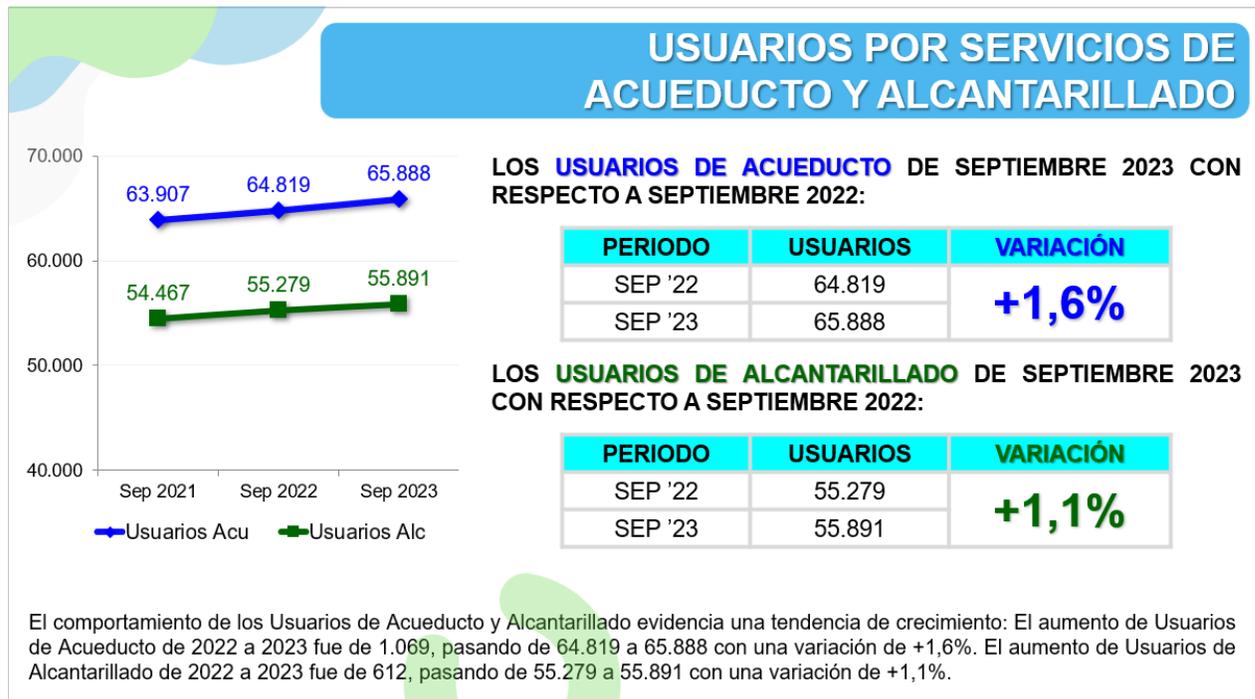

TARIFAS APLICADAS POR SERVICIOS AJUSTE MAYO 2023 A JUNIO 2023

ACUEDUCTO		
Cargo Fijo		
Mayo 2023	Junio 2023	Variación
\$7.788,64	\$8.063,58	3,53%

ACUEDUCTO		
Valor Metro Cúbico Consumido		
Mayo 2023	Junio 2023	Variación
\$2.057,75	\$2.130,35	3,53%

ALCANTARILLADO		
Cargo Fijo		
Mayo 2023	Junio 2023	Variación
\$4.691,47	\$4.857,08	3,53%

ALCANTARILLADO		
Valor Metro Cúbico Vertido		
Mayo 2023	Junio 2023	Variación
\$1.730,16	\$1.809,73	4,60%

Se realizó actualización de tarifas para los Servicios de Acueducto y Alcantarillado, a partir de los consumos del Periodo Junio 2023, en cumplimiento de los lineamientos del Artículo 125 de la Ley 142 de 1994, la Resolución CRA 943 de 2021 y demás normas concordantes.

2.3.3 GESTION COBRO COACTIVO

GESTION COACTIVA Y PERSUASIVA

PROCEOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO
ACTIVOS: 976 EXPEDIENTES.

MEDIDAS CAUTELARES INSCRITAS: 76 MEDIDAS DE EMBARGO SOBRE BIENES INMUEBLES.

RECUADO PROMEDIO MENSUAL DE USUARIOS CON PROSESO DE COBRO COATIVO: 427 USUARIOS REGULARIZADOS CON PAGOS PROMEDIO MENSUAL DE \$ 43.392.613

GESTION PERSUASIVA JURIDICA SECRETARIA GENERAL: 435 ACCIONES PERSUASIVAS JURIDICAS A USUARIOS MAYORES A 60 MESES.

SOLICITUDES DE BAJA EN CUENTAS POR REMISIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES: 13 EXPEDIENTES REMITIDOS AL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE PARA BAJA EN CUENTAS.



PROCESOS DE ADMINISTRATIVOS Y/O PENALES DE DEFRAUDACION DE FLUIDOS : 2 EXPEDIENTES.

GESTION DE CARTERA



PLAN PARA LA GESTION INTEGRAL DE USUARIOS 2023

OBJETIVO: Impactar los objetivos estratégicos organizacionales, a través de la gestión integral de usuarios que redunde en el fortalecimiento organizacional, la mejora continua de los procesos y subprocesos de la compañía y la calidad de vida de nuestros suscriptores/usuarios.

ALCANCE: El plan contiene las estrategias a desarrollar durante la vigencia 2023 por parte de las dependencias de la compañía y el liderazgo de Directivos y Profesionales Jefe.

Dentro de las estrategias a desarrollar para el logro de la Gestión de Cartera, se implementa y fortalecen las siguientes actividades:

- INCLUSIÓN DE NUEVOS USUARIOS - INUS**
- SUSPENSIÓN**
- CORTE**
- PROCESOS PERSUASIVO – JURIDICO**
- CAMPAÑAS DE RECAUDO**
- SOCIALIZACIONES CERO ATRASOS**
- ACTUALIZACIÓN DE DATOS**
- VULNERABILIDAD**
- SANEAMIENTO**

2.4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Promover acciones orientadas a la protección y conservación del recurso hídrico

PTAR SAN SILVESTRE



PLANTA DE LODOS PTAP



Optimización y construcción de los sistemas de sedimentación, retro y proceso de tratamiento de lodos para la planta de tratamiento de agua potable del acueducto urbano del municipio de Barrancabermeja

COLECTOR COMUNA 2



MINIPTARS URBANAS Y RURALES



ESTUDIO PARA IDENTIFICACION DE FUENTE ALTERNA DE ABASTECIMIENTO



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACION DE SUELO, FLORA Y FAUNA, MIRS, PUEAA

- ❖ Participación de la feria de sostenibilidad realizada en el Centro Comercial San Silvestre, Día Mundial del Medio Ambiente
- ❖ Participación de la socialización de la Fábula del Colibrí, Se el cambio que quieres ver I feria Sostenible, en marco del día mundial del medio ambiente
- ❖ Realizamos 7 capacitaciones a grupos de interés en el cuidado y protección de los recursos naturales. Visita Técnica al proceso de potabilización del agua en planta de tratamiento
- ❖ Participación del simulacro virtual realizado por CENIT –Ecopetrol, en las inmediaciones de la ciénega San Silvestre – Reunión posterior a la realización del simulacro virtual

2.5. ASEGURAMIENTO GRUPOS DE VALOR

Ser reconocidos como una empresa competitiva y orientada hacia la mejora del servicio al ciudadano

2.5.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL RSE

SOCIALIZACION DE OBRAS

REUNIÓN INICIAL DE OBRAS

Con el fin de informar a la comunidad el inicio de las obras, se realiza una reunión por cada barrio o sector a intervenir. Con ello queremos activar y consolidar la participación ciudadana, promocionar y practicar la transparencia, pero ante todo , mejorar la prestación del servicio.

Según consulta pública, realizada por nuestro equipo, para las convocatorias el WhatsApp registra 69,6% como el medio más acertado y efectivo de comunicación para llegar a los presidentes de JAC, vocales de control, veedurías, ediles, que son nuestros grupos de interés más relevantes y sigue en su orden de importancia para las convocatorias, la llamada telefónica.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA



SOCIALIZACION DE OBRAS

INICIO DE OBRAS

INICIO DE OBRA PROYECTO REPOSICIÓN TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS:
BOSTON, 20 DE JULIO, CRISTO REY, SANTA ISABEL, LA PAZ, LAS TORRES, VILLA DE LEYVA, EL CAMPESTRE, ALCAZAR



B. BOSTON



B. 20 DE JULIO



B. CRISTO REY



SOCIALIZACION DE OBRAS

INICIO DE OBRAS.

SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS BARRIOS:
NUEVE DE ABRIL, AGUAS CLARAS, 22 DE MARZO, SANTA BARBARA



B. AGUAS CLARAS



B. NUEVE DE ABRIL



B. 22 DE MARZO



SOCIALIZACION DE OBRAS

INICIO DE OBRAS

SOCIALIZACION INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS:
LOS NARANJOS, MANDARINOS, PLANADA DEL CERRO, LOS PINOS, CINCUENTENARIO Y REFUGIO



SOCIALIZACION INICIO DE OBRAS EN LOS BARRIOS DE LA COMUNA 4

SOCIALIZACION DE OBRAS

INICIO DE OBRAS

SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO
BARRIOS: SAN LUIS, VILLA MARY, MIRADOR DEL CINCUENTENARIO VILLANAPOLES, 1ro DE ABRIL.



Aguas de Barrancabermeja consolida la participación ciudadana, promociiona y practica la transparencia

SOCIALIZACION DE PROYECTOS Y OBRAS

SOCIALIZACION OPTIMIZACIÓN COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SECTOR OLAYA HERRERA, PUEBLO NUEVO, URIBE URIBE EN LA COMUNA 2 FASE 1



La construcción del colector evitara que las aguas sigan contaminando la quebrada de las lavanderas y la ciénega Miramar una vez entre en funcionamiento la PTAR San Silvestre.

CONSULTAS PÚBLICAS A GRUPOS DE VALOR E INTERÉS

- Los usuarios señalan el **Saneamiento Básico** como su mayor necesidad, solicitando limpieza de redes por taponamiento. La causa se origina por los **malos hábitos** que tienen las comunidades



- **Comportamiento de los usuarios en el pago de los servicios públicos**

Sigue el pago del agua ocupando el **cuarto lugar** (marca un leve nivel de comprensión en el pago). En su orden de prioridades las comunidades al cancelar los servicios públicos

1. Energía
2. Gas
3. Celular
- 4. Agua**
5. Internet

VULNERABILIDAD EN SERVICIOS PUBLICOS

Al diligenciar la Ficha Técnica para **caracterización de usuarios vulnerables**, hemos encontrado casos de adultos mayores que viven solos y que su único ingreso es la ayuda del Estado de 80.000 pesos.


Recientemente el DANE a través del documento “cambios significativos de Sisbén IV versión” da a conocer que en Barrancabermeja 31,66% de la población se encuentran en la “pobreza extrema” o “indigencia”, es por ello, que se deben tomar **medidas especiales como la de implementar el mínimo vital del servicio de agua potable para esta población.**



OBRAS CON CALIDAD E INTEGRIDAD



En Aguas de Barrancabermeja, dejamos que nuestras obras hablen por sí mismas. 🚧 📌 Cada proyecto refleja nuestra integridad y compromiso con la comunidad. 🙌 📱 #Integridad 🌟



OBRAS QUE CAMBIAN VIDAS



OFERTA INSTITUCIONAL

⚠️ ¡Atención! 💧 Aguas de Barrancabermeja en oferta Institucional. Estamos para ayudarte con acuerdos de pago, normalización del servicio, solicitudes de acueducto y alcantarillado, abonos, actualización de datos, ¡y mucho más! No pierdas esta oportunidad de resolver tus inquietudes.

#AguasdeBarrancabermeja

#ServiciosPúblicos #TuAlcaldía

📅 Sábado, 16 de septiembre de 2023.

📍 Cancha del Barrio las Playas.

🕒 Los esperamos hasta las 12 M.



aguas de Barrancabermeja | Gobierno de Obras

OFERTA INSTITUCIONAL

ACUERDOS DE PAGO, NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO, SOLICITUDES E INQUIETUDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ABONOS, ACTUALIZACIÓN DE DATOS ENTRE OTROS.

📅 SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE 2023
🕒 HORA: 8:00 A.M. A 12:00 M.
📍 BARRIO VILLA AURA (PLAZOLETA) COMUNA 7

TRÁMITES FÁCILES Y SEGUROS

¡Sus trámites fáciles y seguros!

Conexión a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado

Requisitos

- ✓ Diligenciar el formato único de solicitud de conexión firmado por el propietario o poseedor del inmueble.
- ✓ Fotocopia de la cédula de ciudadanía
- ✓ Número del usuario ID (que está en la factura) del predio del vecino
- ✓ Fotocopia de la factura de compra del equipo de medida y su certificado de calibración no mayor a un año.
- ✓ El usuario deberá contar con la caja y tapa para el enlace entre la acometida y la instalación interna del servicio de acueducto donde se instala el medidor.
- ✓ Original y copia del pago de los derechos a conexión y disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Más información en:
Líneas de atención: 3502118839-018000413787 opción 1
Chat virtual: www.aguasdebarrancabermeja.gov.co




➡ Con el equipo de Comercial brindamos orientación a nuestros usuarios sobre el servicio de acueducto y alcantarillado.

◆ También asesoramos para que todos puedan ponerse al día con el pago de la factura.

🗣️ Anímese, es hora de ser #SerLegalConAguas

Brindamos

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA



Gobierno
de Obras

